

場所：台場区民センター
令和7年7月4日（金） 19：30～
令和7年7月5日（土） 19：00～

お台場海浜公園噴水施設(7)整備工事 工事説明会


東京都港湾局 東京港管理事務所臨海地域管理課
東洋建設株式会社

1 設置趣旨

臨海副都心のより一層の魅力向上と賑わい創出を図るため、新たなランドマークとなる噴水をお台場海浜公園に整備

2 設置場所

- ・集客動線や視認性に効果的な位置に設置

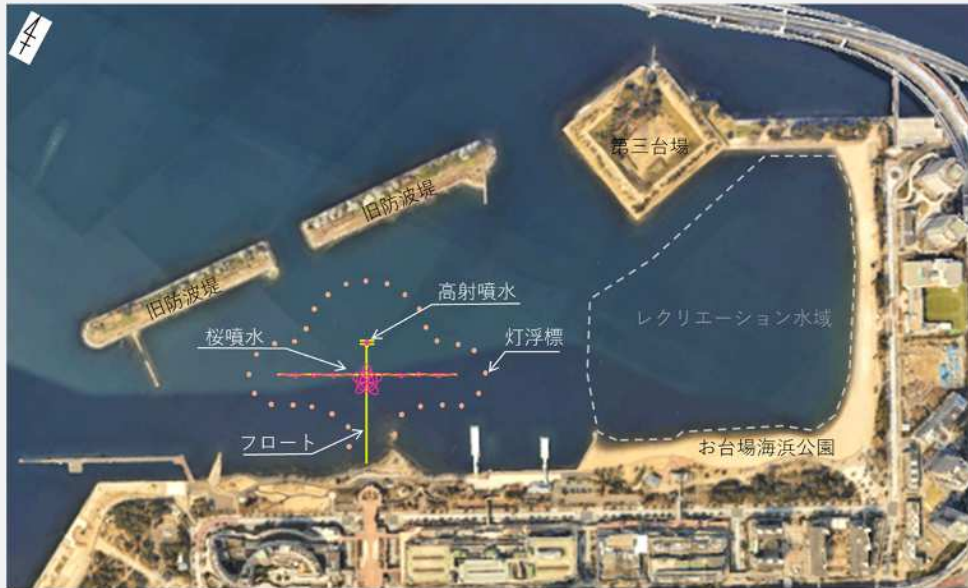

3 運用方法（案）

運用時間	毎日11:00～21:00 10回/日 ※メンテナンスによる休止等あり
演出時間	約10分間/回
噴射高	風速により自動制御（強風時は中止）
水域の影響	最大影響範囲（灯浮標の範囲内）は常時、進入禁止エリアに設定

4 整備スケジュール

※現時点での予定

令和7年（2025年） 夏頃 現場工事着手

令和8年（2026年） 3月 工事完了

5 演出等について

○演出について

- ・音楽に合わせて噴射、夜間はLED照明による演出。
- ・演出内容等は、地元の小中学校や住民の皆様等のご意見を踏まえながら今後検討。

○安全対策について

- ・公園内に風速センサーを設置し、風速に応じて噴射高を自動的に制御。強風時には演出を中止。
- ・監視員を配置し、手動による緊急停止スイッチを設置。
- ・水域内の安全確保策は、海上保安部と調整中。

6 ホームページのご案内

- ・特設HPでODAIBAファウンテンの検討状況や、疑問点に対する回答を掲載



URL：https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/kanko/park/odaiba_fountain


工事概要

- 工事件名 お台場海浜公園噴水施設(7)整備工事
- 工 期 令和7年4月16日～令和8年2月27日まで
- 発注者名 東京都
- 受注者名 東洋建設株式会社

※ 次頁以降の内容は現時点のものであり、今後、変更となる場合があります

工事概要

■工事平面図

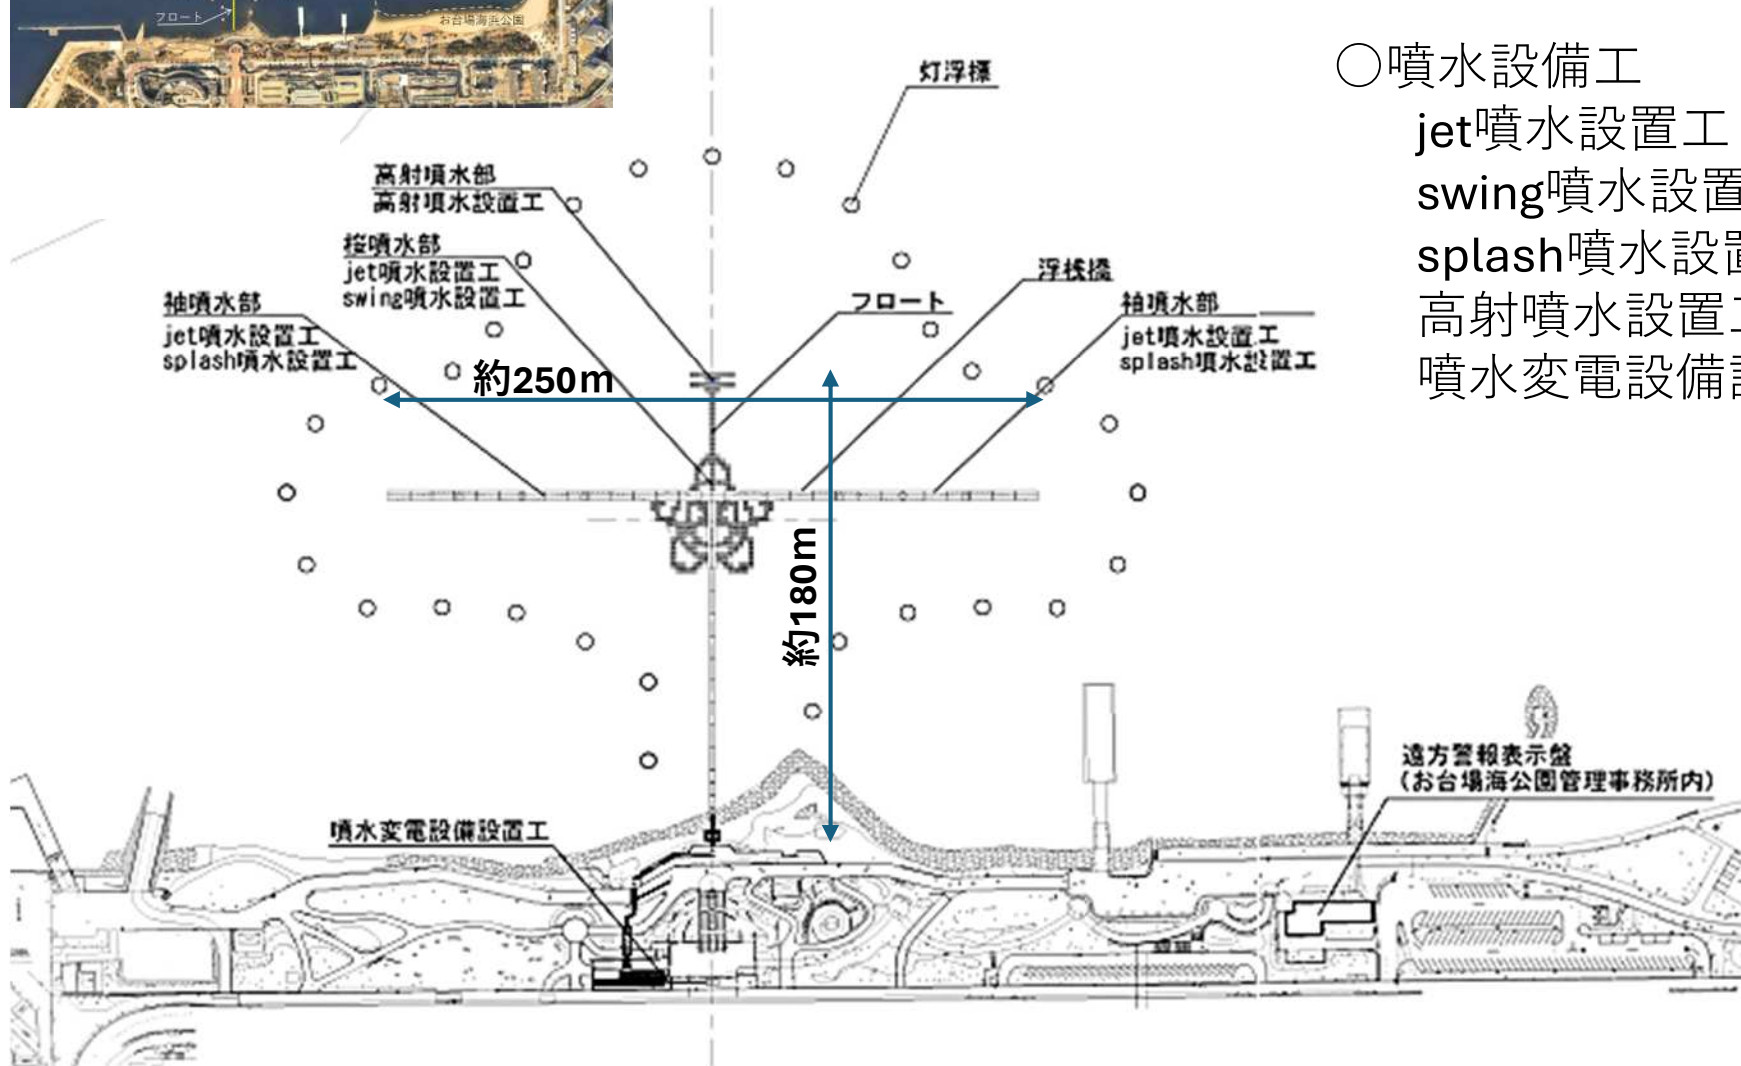

■主な工事内容

○噴水フロート工

浮棧橋

73基

連結式樹脂フロート

211基

ヒンジ連結式浮棧橋

4基

○噴水設備工

jet噴水設置工

312基

swing噴水設置工

66基

splash噴水設置工

174基


高射噴水設置工

一式

噴水変電設備設置工

一式


工事中の利用制限エリア(陸上部)

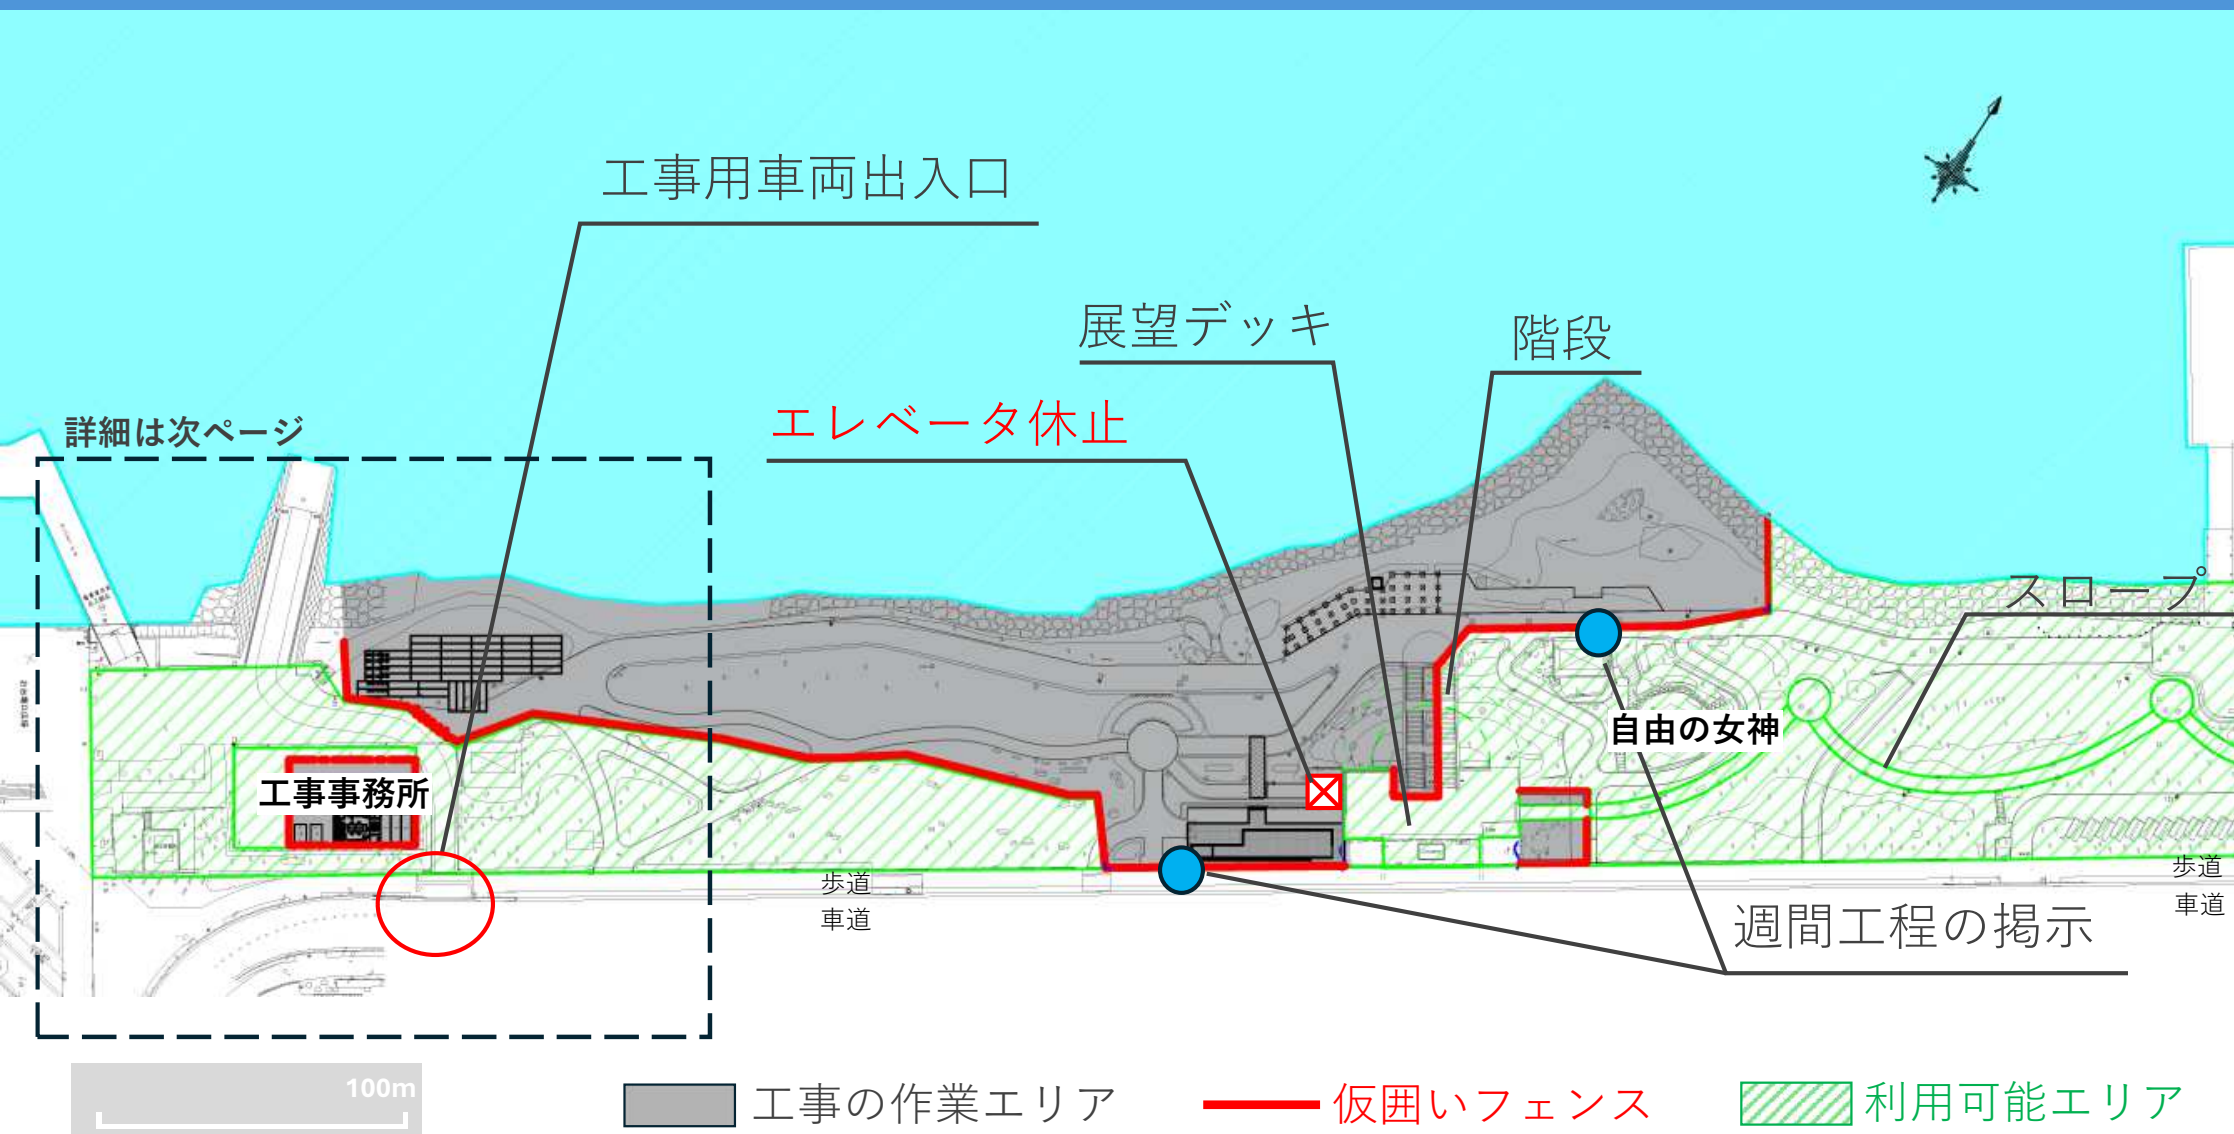

- ・ 仮囲いフェンスによる利用制限期間：令和7年7月中旬～令和8年2月下旬
- ・ 利用制限期間中、展望デッキのエレベーターは休止
(展望デッキ及び階段の半分、スロープは利用可能。周辺施設のエレベーターを案内)

工事中の利用制限エリア(海上部)

※イメージ

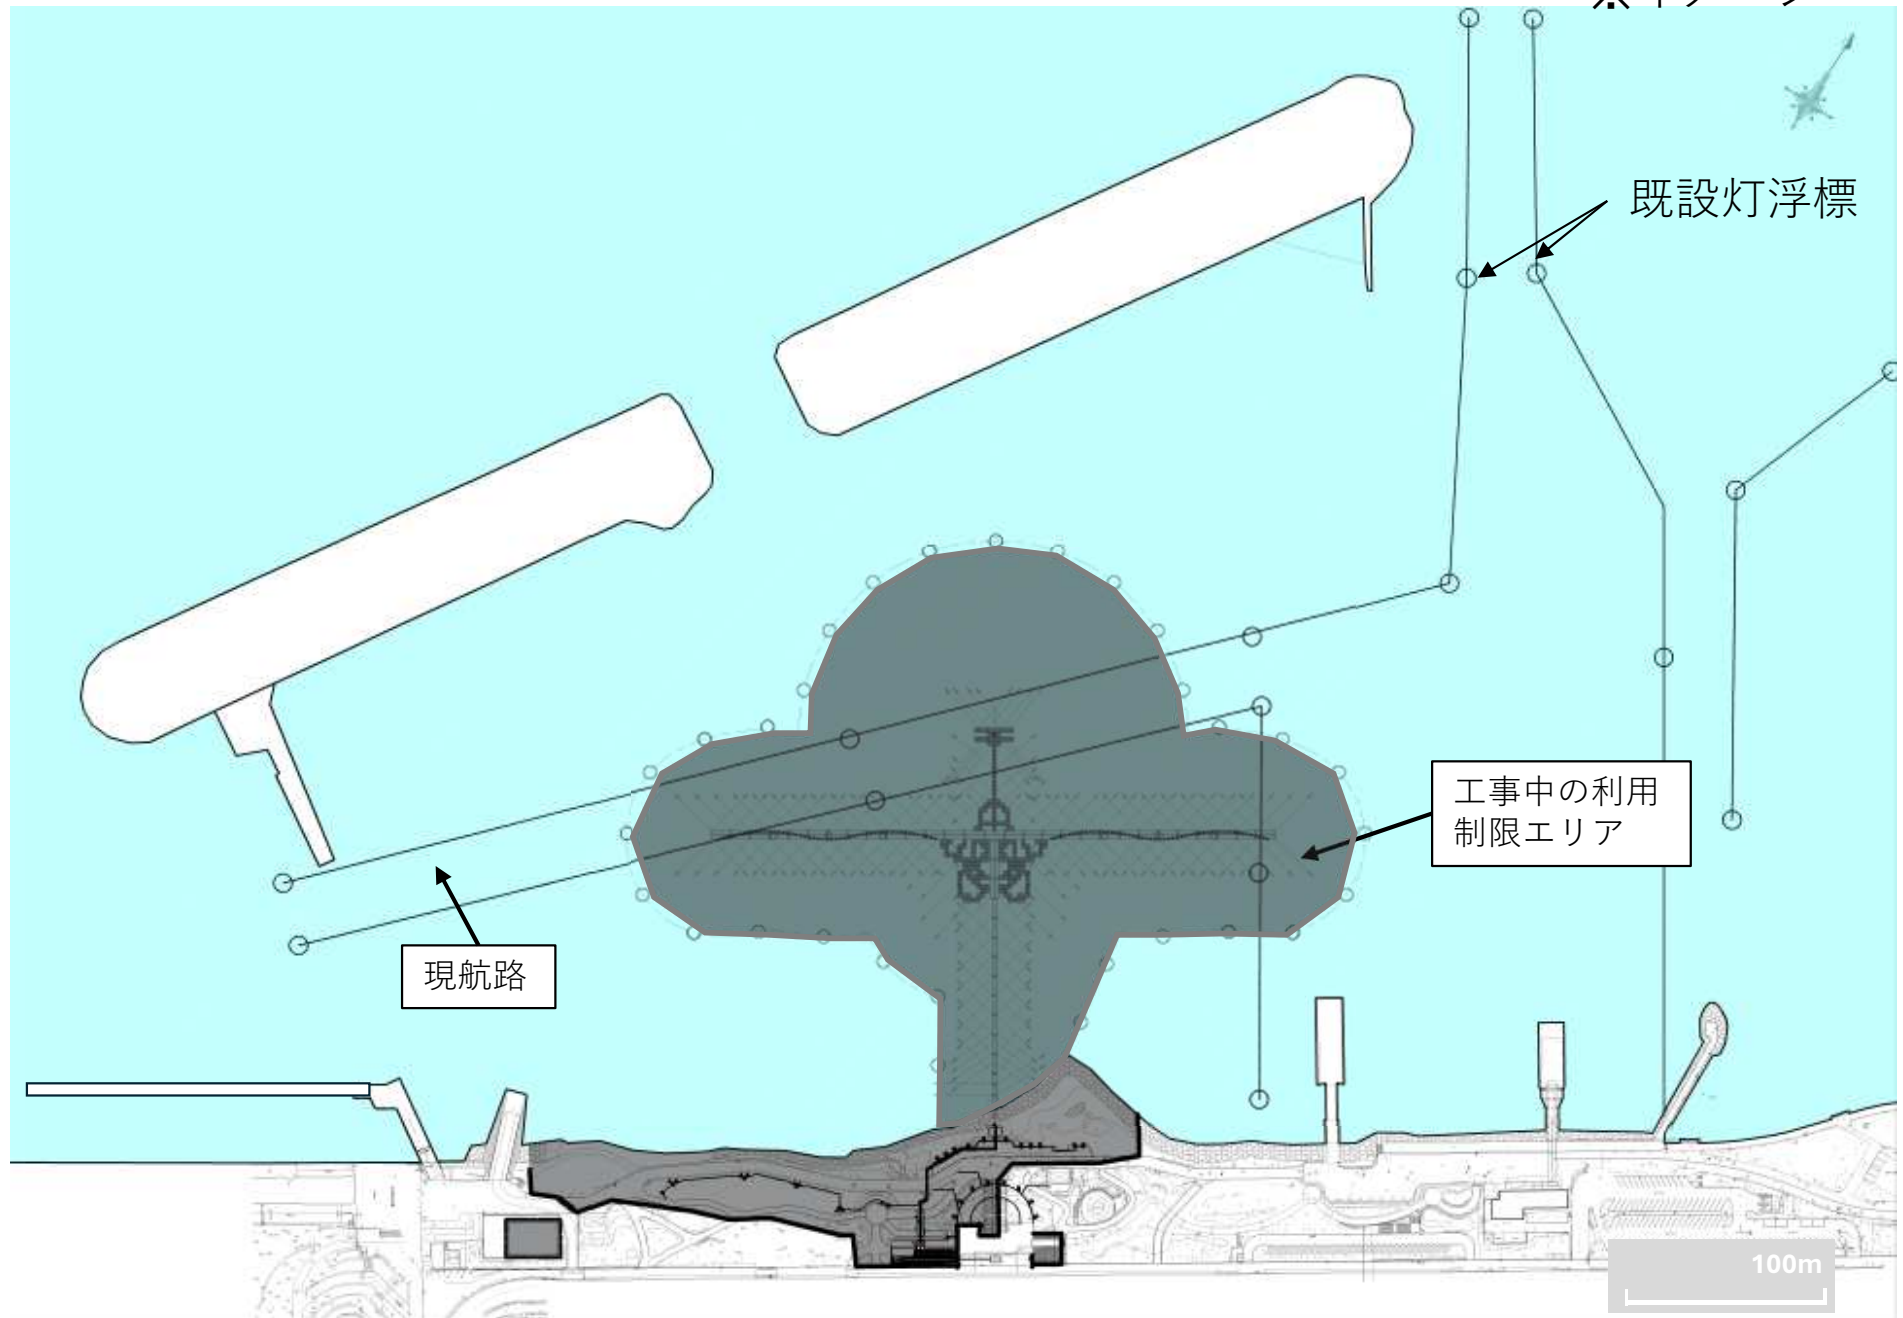

■ 工事の作業エリア

工程表

主な工種区分			令和7年										令和8年	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	
工事	準備工	各種申請、届出、調査												
		仮囲い設置工												
	陸上工事	配管敷設工												
		噴水変電設備設置工												
		音響設備設置工												
	海上工事	海底土砂均し工												
		フロート設置工												
		噴水設備設置工												
	運転調整 後片付け	運転調整												
		仮囲い撤去工												

現場での工事開始
(7/14予定)

夏季
休暇

年
末
年
始
休
暇

■ 施工時間 〈昼間作業〉 陸上部：午前8時～午後5時頃
海上部：午前7時～午後4時頃

- ・ 土曜日、日曜日は作業を行わない予定
(ただし、工事工程の都合上、作業が必要な場合は、事前にお知らせしたうえで作業を行うことがあります)
- ・ 作業船は、土日は基地港へ退避

工事状況(7月中旬～7月下旬)

施工範囲図

使用する機械・資材

仮囲いフェンス(準備工)



既設灯浮標

配管敷設工


仮囲いフェンス設置工

100m

■ 工事の作業エリア

工事状況(8月上旬～8月下旬)

施工範囲図

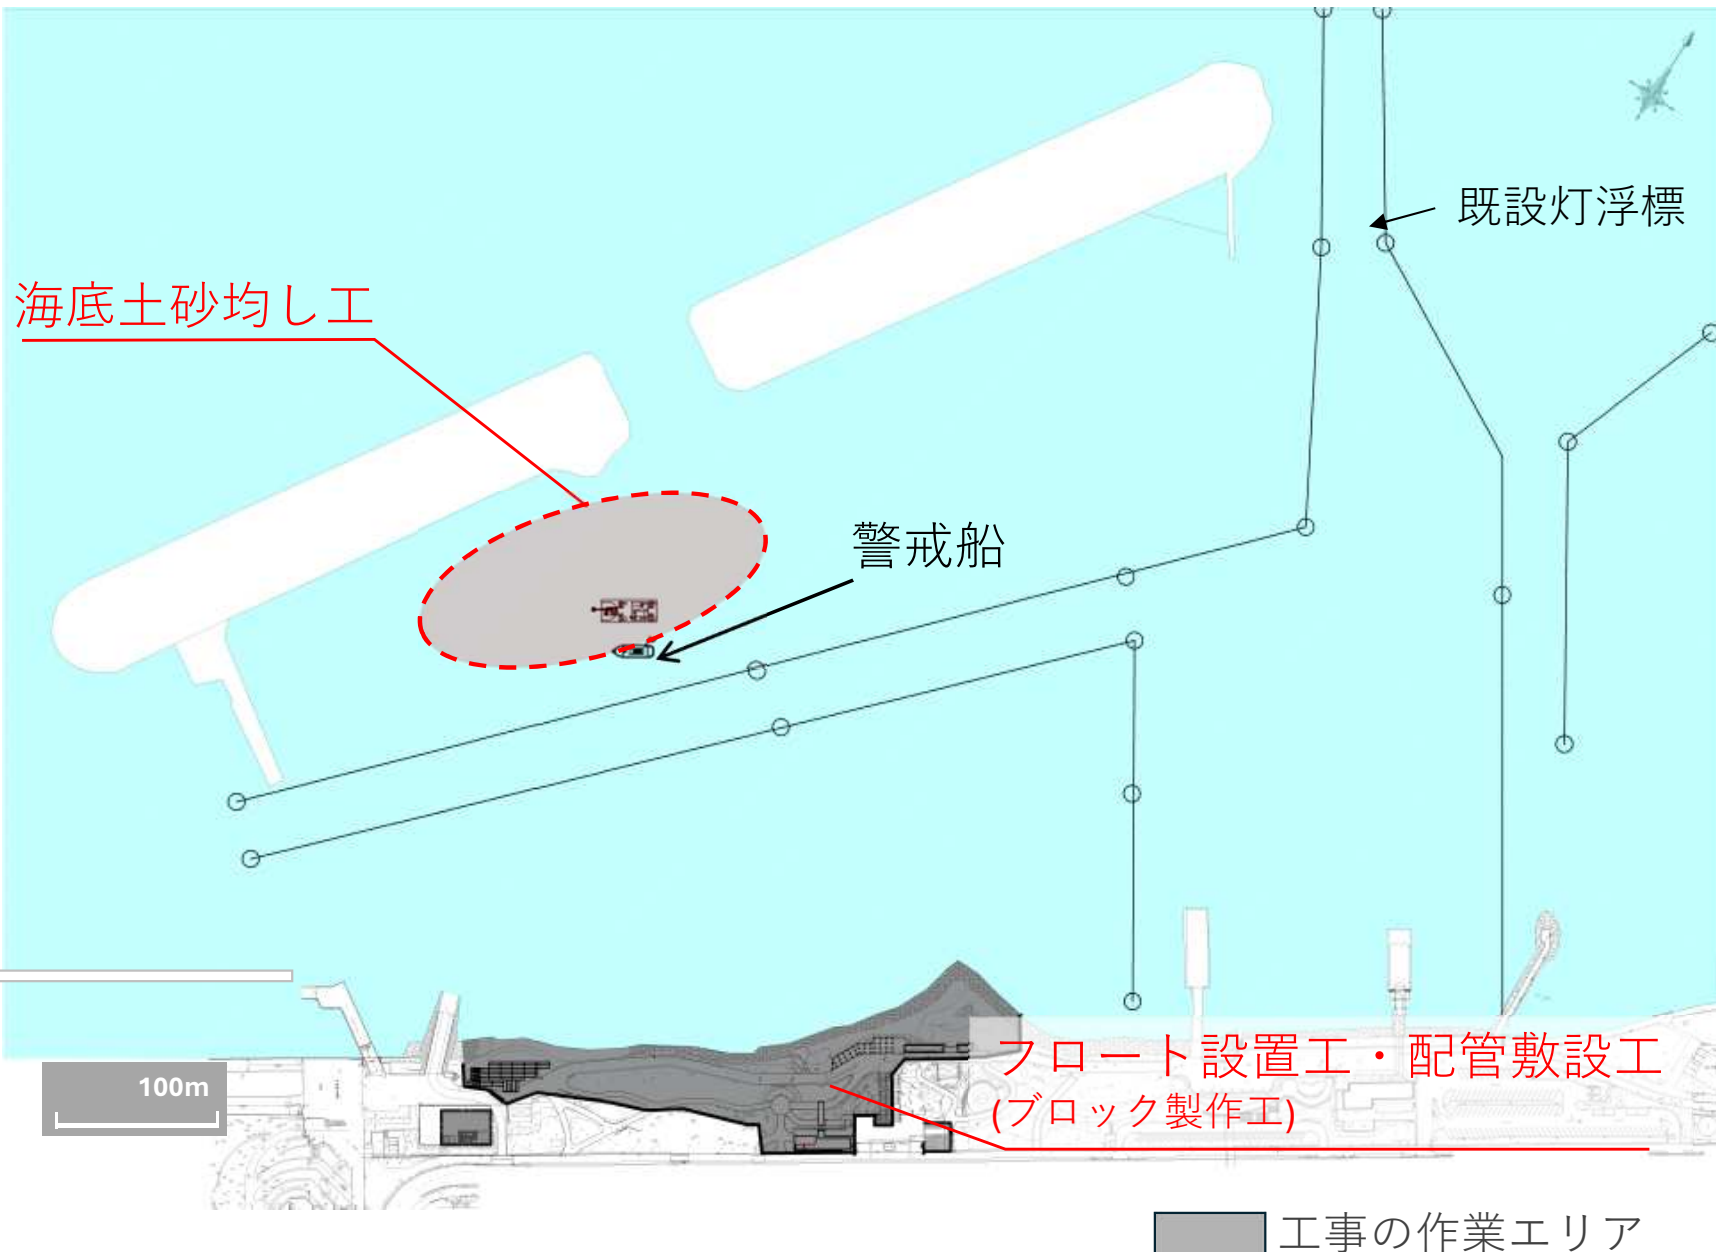

使用する機械・資材

バックホウ台船(海底土砂均し工)



コンクリートポンプ車
(ブロック製作工)




ミキサー車
(ブロック製作工)



工事状況(9月上旬～9月下旬)

施工範囲図

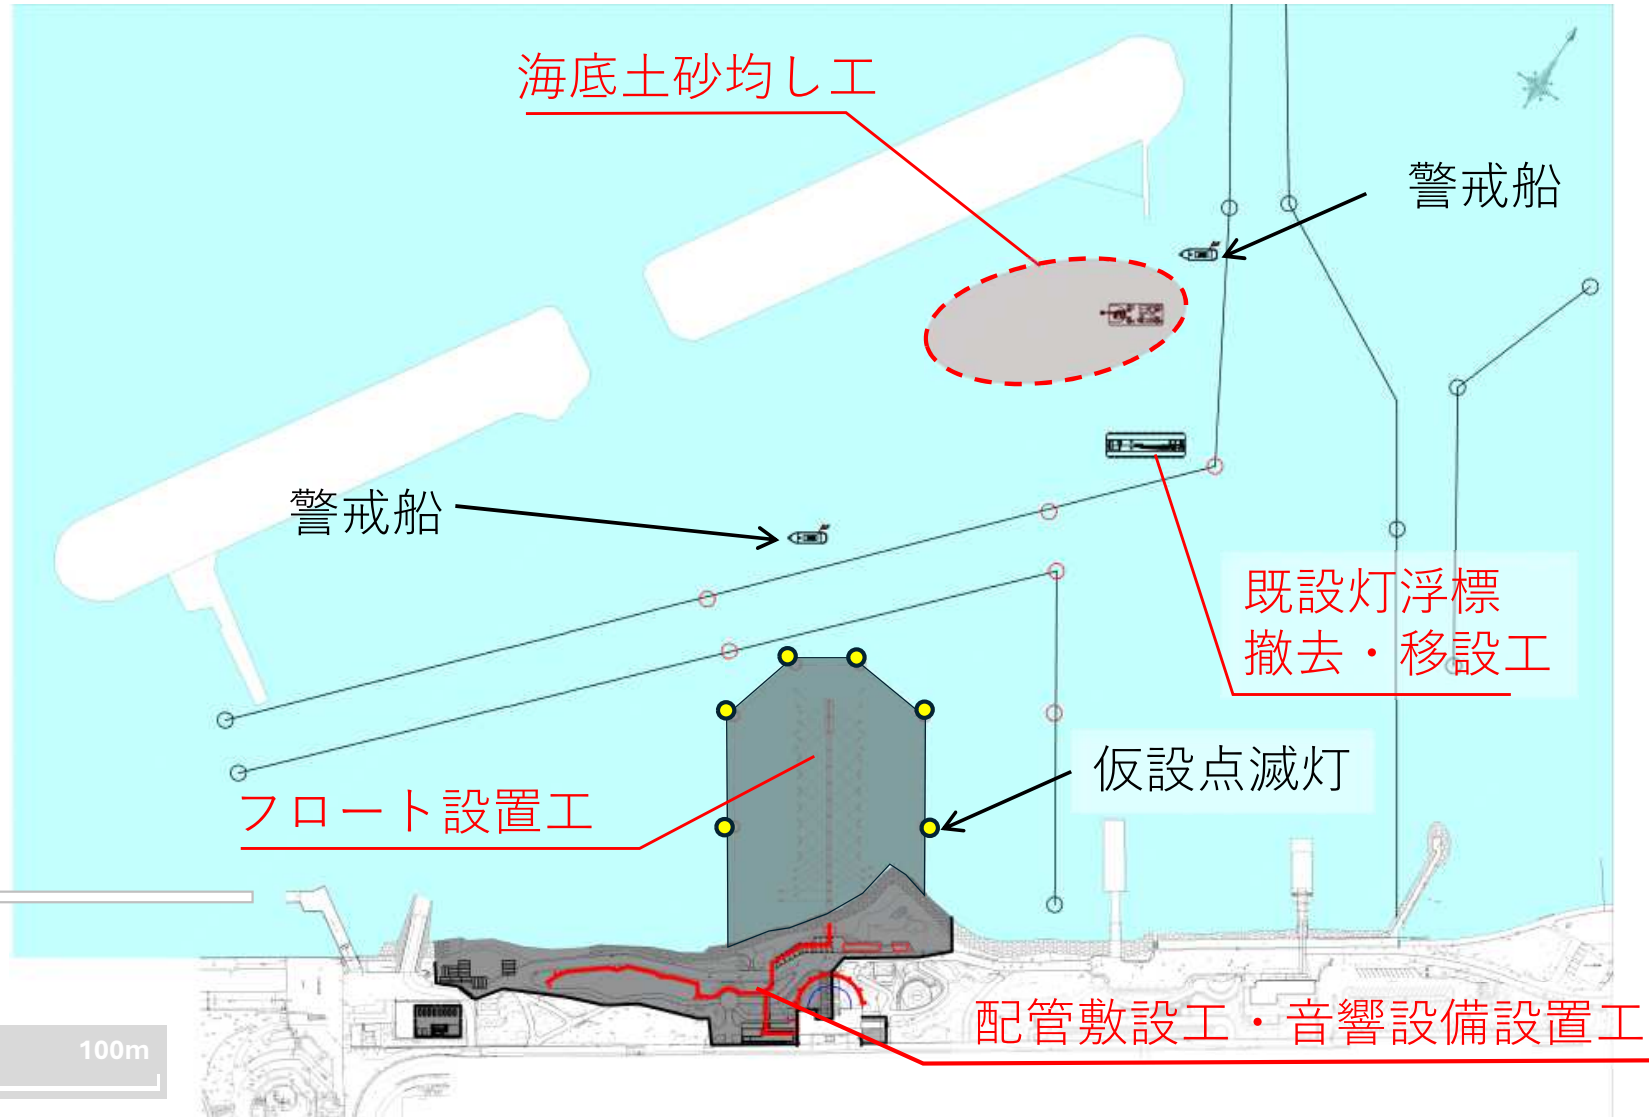

使用する機械・資材

ミキサー車
(配管敷設工)



コンクリートポンプ車
(配管敷設工)



クレーン付台船
(既設灯浮標撤去・移設工)



作業船
(フロート設置工・
灯浮標設置工)



ラフタークレーン
(フロート設置工)



バックホウ台船
(海底土砂均し工)




高所作業車
(音響設備設置工)



工事状況(10月上旬～1月下旬)

施工範囲図

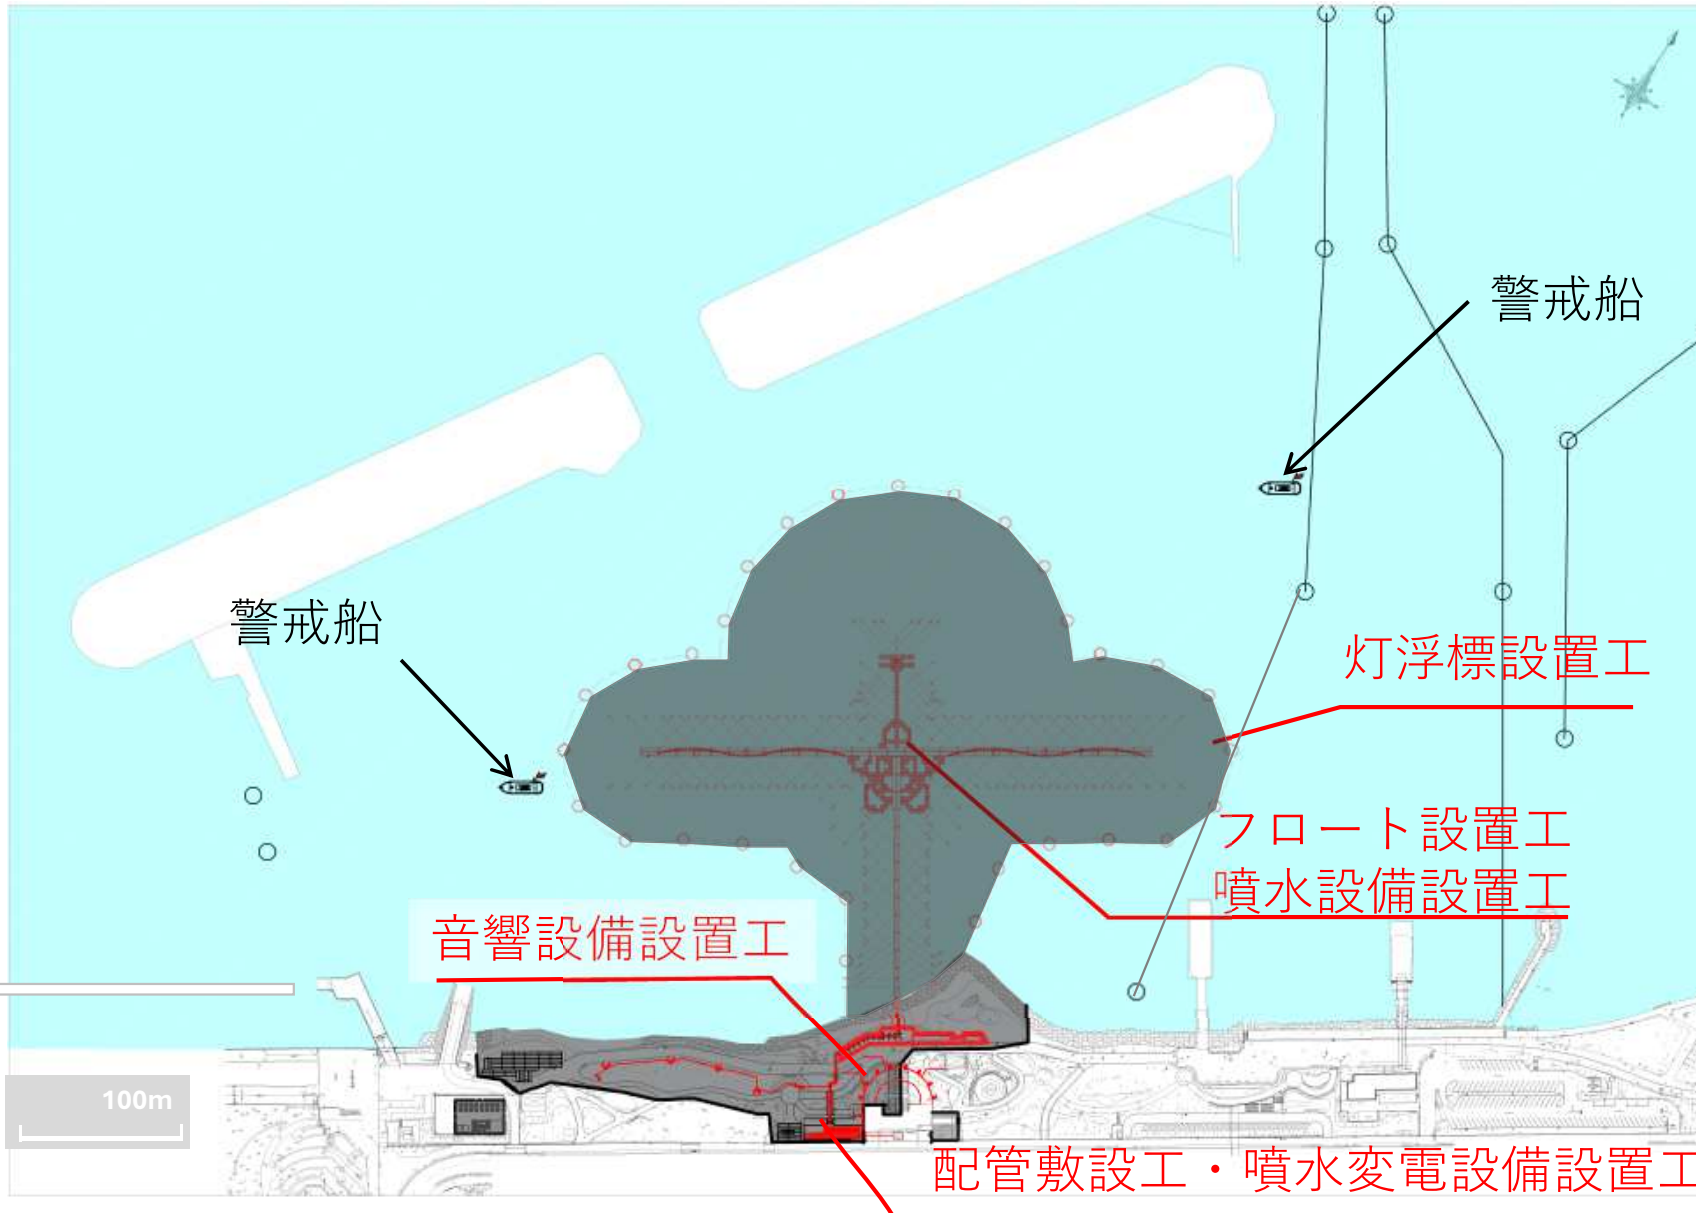

使用する機械・資材

作業船
(フロート設置工
・ 噴水設備設置工)



ラフタークレーン
(フロート設置工・
噴水変電設備設置工)



高所作業車
(音響設備設置工)



■ 工事の作業エリア

工事状況(2月上旬～2月下旬)

施工範囲図

警戒船 2 隻を配置

運転調整・
仮囲い撤去（後片付け工）

■ 工事の作業エリア

使用する機械・資材


ラフタークレーン
(後片付け工)



バックホウ(後片付け工)



工事後の状況(3月～)

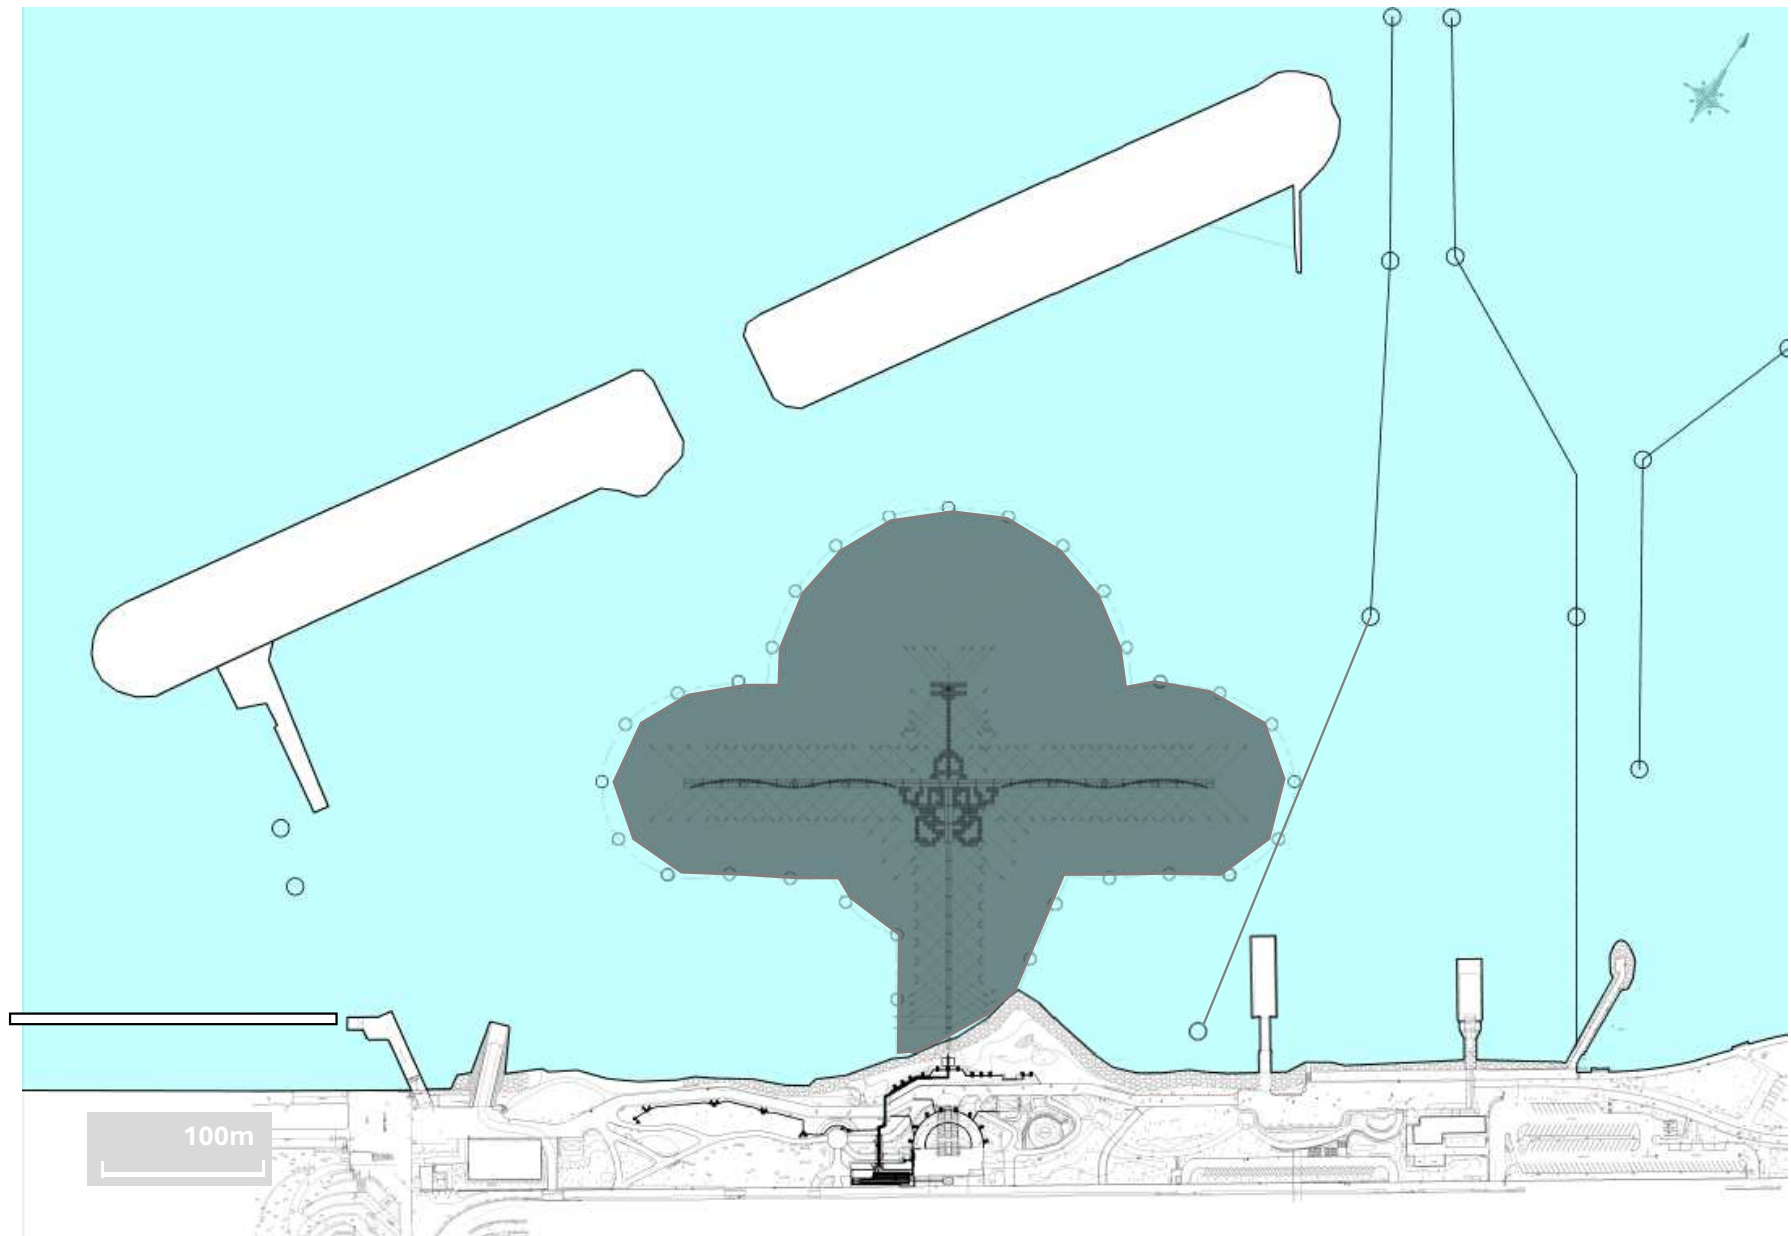

制限エリア

環境対策について

工事のお知らせ

- ・近隣にお住いの皆様や公園利用の方々に、工事内容・工事場所がわかるように公園内と歩道脇に週間工程表を掲示します。

使用する機械・車両

- ・低騒音型・低振動型・排出ガス対策型の建設機械を使用します。
- ・使用車両は、ディーゼル車規制適合車を使用します。



排出ガス対策型
建設機械



低騒音型
建設機械



超低騒音型
建設機械

防塵対策

- ・現場周辺は常に路面の清掃を行い、必要に応じて散水を行い防塵対策に努めます。

●工事について

受注者：東洋建設株式会社

現場代理人：山部(やまべ)

電話番号：070-2264-1253

工事事務所：東京都港区台場一丁目（お台場海浜公園内）

発注者：東京都港湾局 東京港管理事務所 臨海地域管理課

担当者：渡井、高辻、新藤

電話番号：03-5463-0245
