


中防内5号線橋りょうほか整備工事

1 施工箇所

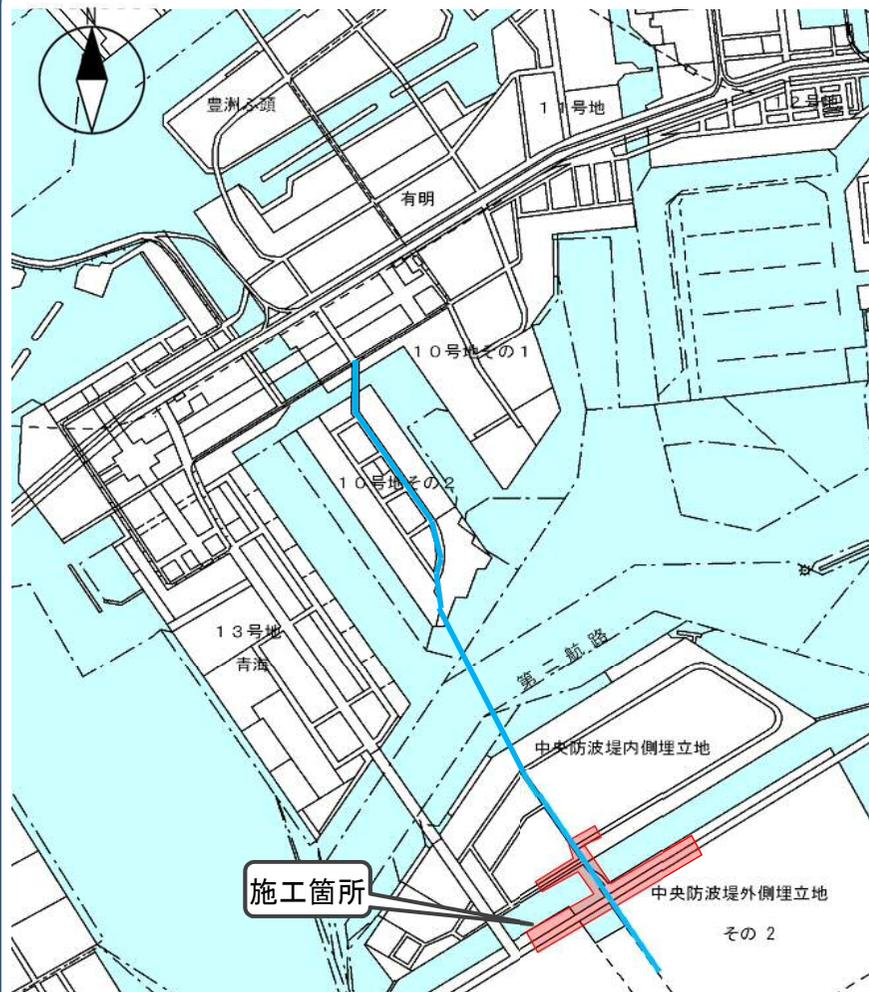

臨港道路南北線及び接続道路

2 工事概要


- ◆ 工事件名
平成27年度中防内5号線橋りょうほか整備工事
- ◆ 施工箇所
江東区青海三丁目地先
(中央防波堤内側埋立地から中央防波堤外側埋立地まで)
- ◆ 工期
平成27年10月 ~ 平成31年7月
- ◆ 問い合わせ先
担当部署: 東京港建設事務所
港湾整備課(道路整備担当)
連絡先: 03-5500-3226
- ◆ 工事説明資料
より詳しい工事内容は、下記よりご覧ください。
<http://www.kouwan.metro.tokyo.jp/jigyo/5gousen.H30.3.pdf>

3 工事の目的

中央防波堤地区の開発に伴い、将来交通量の増加が見込まれることから、円滑な物流を確保するため、中央防波堤地区と有明地区とを結ぶ、臨港道路南北線及び接続道路の整備を行っています。

本工事は、このうち中央防波堤内側埋立地と外側埋立地をつなぐ、臨港道路南北線に接続する橋りょうを整備するものです。


4 完成イメージ

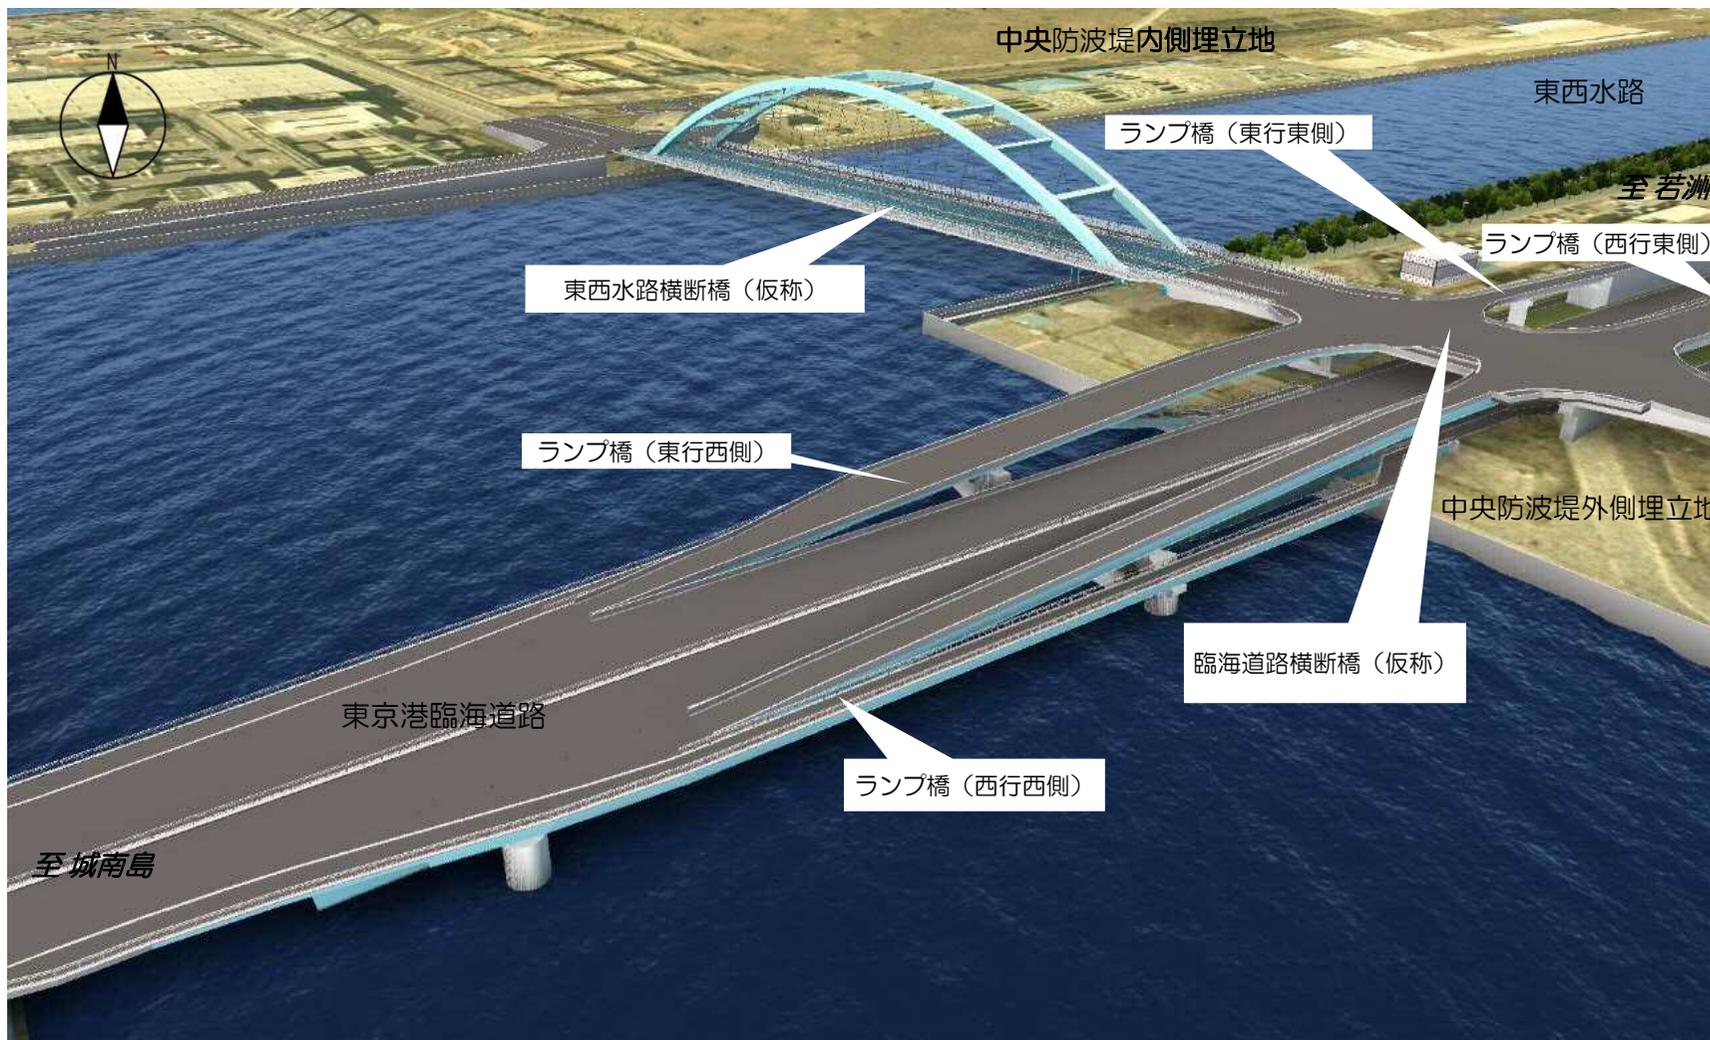

※ パースは、完成イメージです

5 定点写真

港湾局工事の実施状況
(中防内5号線橋りょう)

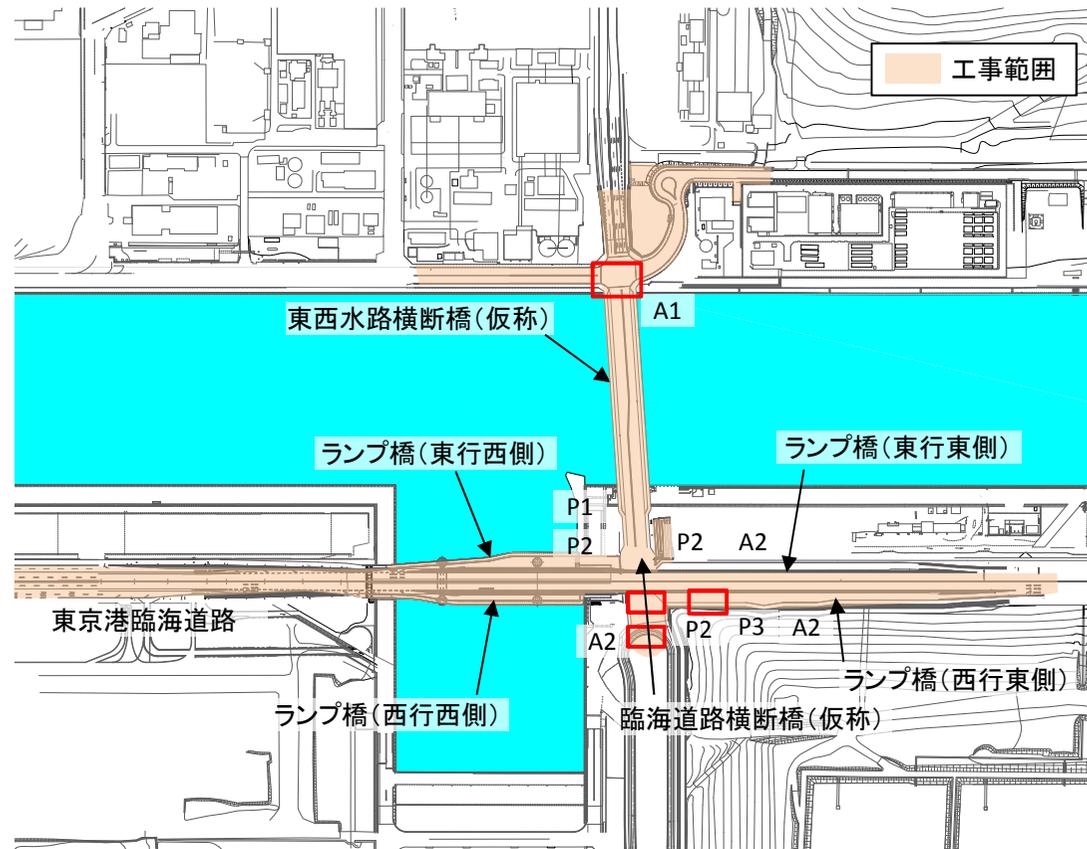

平成30年1月



平成29年11月



5 定点写真


平成29年9月



平成29年7月



6-1 工事写真（東西水路横断橋（仮称）橋台A1）

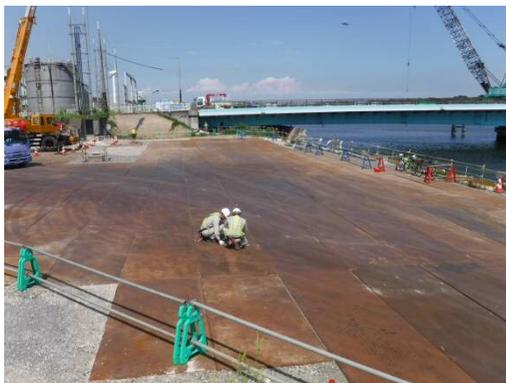

ヤード整備
平成29年7月



地中障害物撤去
平成29年8月



地中障害物撤去
平成29年10月



鋼管矢板打設
平成29年11月



鋼管矢板中詰コンクリート打設
平成29年12月



鋼管矢板基礎
平成30年1月

6-2 工事写真（東西水路横断橋（仮称）桁組立全景）

平成30年3月



平成30年1月



6-2 工事写真（東西水路横断橋（仮称）桁組立全景）

平成29年12月



平成29年11月



6-2 工事写真（東西水路横断橋（仮称）桁組立全景）

平成29年10月



平成29年9月



6-2 工事写真（東西水路横断橋（仮称）桁組立全景）

平成29年8月



平成29年7月



6-3 工事写真（臨海道路横断橋（仮称）橋台A2・橋脚）



ヤード整備
平成29年7月



掘削
平成29年8月



躯体構築
平成29年9月



躯体構築
平成29年10月



躯体構築
平成29年11月



躯体構築
平成29年12月

6-3 工事写真（臨海道路横断橋（仮称）橋台A2・橋脚）



躯体構築
平成30年1月

6-4 工事写真（ランプ橋（西行東側））



基礎杭打設
平成29年7月



基礎杭打設
平成29年8月



基礎杭打設
平成29年9月



掘削
平成29年10月



躯体構築
平成29年11月



躯体構築
平成29年12月

6-4 工事写真（ランプ橋（西行東側））



躯体構築工
平成30年1月
